



Technology & Infrastructure

TEAMS-meeting
VKM-overleg contractoren
Vooruitblik stilstanden najaar 2020

27-08-2020

Johnny Latré

Werner Van Acker

Raf Van Look

VKM-risicobeheer

TS-stilstandsmanagement

TS-Contractormangement

1. WELKOM & AGENDA

1. Inleiding (Raf Van Look)
2. Testje mentimeter (Werner Van Acker)
3. Bespreking OMW / Incidenten (Johnny Latré)
4. Corona (Johnny Latré)
5. LMRA+ (Johnny Latré)
6. Instructie stellingbouw (Raf Van Look)
7. Stilstandsvoorbereiding (Werner Van Acker)
8. Vragenronde & slot

AFSPRAKEN

1. Alle microfoons worden uitgeschakeld
2. Vragen via chatfunctie
3. Tussentijds is er wel kans tot mondelinge communicatie.

TEST MENTIMETER



www.mentimeter.com

Gebruik code : 32 60 17 3

Overzicht 2020: Verzorgingen en ongevallen derden

	Overzicht 2020 (januari - juli)		
	januari - februari	maart - juli	Cumul
Totaal	7	17	22
Verzorgingen	4	12	16
Ongevallen zonder werkverlet	1	3	4
Ongevallen met werkverlet	2	0	2
Woon-werk verkeer	0	0	0
Ongevallen in onderzoek	0	0	0

Incidenten maart – april – mei – juni – juli 2020

Contractoren

GEEN ongevallen met werkverlet!

Evonik

3 ongevallen met werkverlet



- 15.05 FK-v Gestruikeld over messen van vorkheftruck
- 26.05 ME Gevallen over Engelse sleutel
- 22.06 EMR Tijdens opstappen fiets → pijscheut in de rug

CORONA-maatregelen op onze site

- Basisprincipe

- **Steeds 1,5 m afstand houden, sociale contacten beperken**
- **Mondmasker steeds bijhebben**
- Medewerkers die symptomen vertonen of waarvan inwonende huisgenoten COVID-19 positief getest zijn, komen niet naar het werk
- Hygiënemaatregelen strikt toepassen bij hoesten of niezen.
- Handen regelmatig wassen met water en zeep.



CORONA-maatregelen op onze site

- Het dragen van een mondmasker is **verplicht**:
 - Bij verplaatsingen in alle gesloten gebouwen
 - Indien de afstand van 1,5 m, zelfs kortstondig, niet kan aangehouden worden
 - In voertuigen met meer dan alleen een chauffeur
 - Bij recente terugkeer uit een “oranje zone “ in het buitenland
 - Na laagrisico-contact op het werk met een COVID-positief geteste collega

- Dit betekent **geen** MNS-maskerplicht (voor zover afstand van 1,5 m aangehouden wordt):
 - Op straten en pleinen
 - In procesinstallaties, inclusief verzendingshallen en opslaghallen
 - Voor chauffeurs die alleen in hun voertuig zitten
 - Voor zittende en staande stationaire activiteiten aan een werkpost

CORONA-maatregelen op onze site

- Rookhuisjes
 - 1,5 m afstand bewaren
 - Indien niet mogelijk, andere locatie zoeken of beurt afwachten
 - 6 extra rookcontainers + extra rookhuisje aan goedereningang
 - Spreek elkaar aan!
 - Extra controles door bewaking en leidinggevenden.
 - Indien afspraken niet nageleefd worden → verwijdering van rookcontainers
- Beperking van aantal contractoren in bordzaal blijft van kracht
 - 1 persoon per vakgroep bv. Brigadier/teamleider meldt zichzelf en zijn medewerkers aan
 - Contractoren uit Oranje of Rode zone worden op dezelfde wijze als Evonik-medewerkers behandeld.
Dit is een taak van de werfleider om dit op te volgen



MB van 22-08-2020 rond Corona en buitenlandse werknemers/onderaannemers

§ 1. Iedere werkgever of gebruiker die tijdelijk beroep doet op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige voor het uitvoeren van werkzaamheden in België in de sectoren **bouw, schoonmaak en land-en tuinbouw** is verplicht om, vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan, een geactualiseerd register bij te houden met volgende gegevens. In deze eerste zin staat ook de verwijzing naar Welzijnswet 6ter. [Art. 6ter](#). De werken bedoeld in artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders vormen het voorwerp van een voorafgaande aangifte bij de daartoe door de Koning aangeduide overheid. Deze aangifte gebeurt overeenkomstig de bepalingen van artikel 30bis van voormelde wet van 27 juni 1969 en de uitvoeringsbesluiten ervan.

1° volgende identificatiegegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige:

- de naam en voornamen;
- de geboortedatum;
- het identificatienummer bedoeld in artikel 8, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

2° de verblijfplaats van de werknemer of zelfstandige gedurende zijn werkzaamheden in België;

3° het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd;

4° in voorkomend geval, de aanduiding van de personen waarmee de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt.

De verplichting tot registratie bedoeld in deze paragraaf is niet van toepassing op de tewerkstelling van grensarbeiders en geldt evenmin wanneer het verblijf van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige in België minder dan 48 uur duurt

Het register bedoeld in het eerste lid wordt ter beschikking gehouden van alle diensten en instellingen die belast zijn met de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, alsook van alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

§ 2. Indien de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige ertoe gehouden is het Passenger Locator Form bedoeld in artikel 18 in te vullen, dan dient de werkgever of gebruiker die tijdelijk op hem een beroep doet voor de uitvoering van werkzaamheden in de **sectoren bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw**, vóór de aanvang van de werkzaamheden na te gaan of het Passenger Locator Form effectief werd ingevuld. Bij gebrek aan bewijs dat dit formulier werd ingevuld, dient de werkgever of gebruiker erover te waken dat het Passenger Locator Form ingevuld is uiterlijk op het moment waarop de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige de werkzaamheden in België aanvat.”

Antwoorden via www.mentimeter.com



www.mentimeter.com

Gebruik code : 32 60 17 3

Doorvoeren LMRA+

LMRA = Last Minute Risico Analyse

Of anders vertaald...

Het uitvoeren van een laatste controle om zeker te stellen dat alle randomstandigheden in orde zijn, zodanig dat de actie op een veilige manier kan worden uitgevoerd.

Een LMRA wordt uitgevoerd net voor het starten van een job of na een werkonderbreking.

Een voorbeeld hiervan is nakijken of alles nog in orde is na het gaan drinken van een kop koffie.

“Heeft een collega ondertussen al het één en ander veranderd waardoor er bijkomende risico's kunnen ontstaan zijn?”

Doorvoeren LMRA+

Wie?

LMRA+ wordt uitgevoerd door minstens 2 personen:

- Medewerker(s) eigen aan de eenheid
- Uitvoerder(s) van de job/opdracht

Wanneer?

- Bij algemene risicovolle wzh / activiteiten
- Bijkomend LMRA+ doorvoeren op steekproef basis (doel: 1 LMRA+ per shift)

Uitvoerder(s) heeft (hebben) altijd het recht om LMRA+ met medewerker van de eenheid door te voeren omdat productiemedewerkers de kennis hebben van installatie en producteigenschappen.

Antwoorden via www.mentimeter.com



www.mentimeter.com

Gebruik code : 32 60 17 3

GEACTUALISEERDE INSTRUCTIE STELLINGBOUW

Wettelijke achtergrond & verantwoordelijkheden

➔ bevoegde personen bij gebruiker en bij stellingbouwcontractor

EVONIK CONTRACTORS	XERVON
EVONIK & CONTRACTORS	XERVON
Bevoegd personen - Controle stellingen ➔ Bouwtechniek (EVONIK) ➔ Ook bij contractor Gebruikers - Opgeleid - Herkennen defecten	Bevoegde personen: montageschema's, berekeningsnota's Stellingbouwers: opgeleid

GEACTUALISEERDE INSTRUCTIE STELLINGBOUW

- Inspecties & keuringen door Bouwtechniek / XERVON
- Bij vrijgave (XERVON)
- Elke maand (XERVON)
- Steekproeven (Bouwtechniek)



STELLINGBOUW FIRMANAAM	
Stellingnummer: _____	
Locatie: _____	Opmerkingen: _____ _____ _____
Opdrachtgever: _____	
Montagedatum: _____	
te vrijgave door: _____	
Standaard stelling: _____	Ladders: _____ _____ _____
Volgens berekeningsnota: _____	
Lichte afwijking: _____	
Teelaatbare vloerbelasting: ☐ 200 kg/m ² ☐ 300 kg/m ²	
Zeilen toegestaan: JA / NEE	
Deze stelling is gebouwd volgens Code Van Goede Praktijk en voorschriften stellingbouwbedrijf	
Respecteer de instructienota	
STELLING MAG BETREDEN WORDEN	
VERBODEN STELLING TE WIJZIGEN	

GEACTUALISEERDE INSTRUCTIE STELLINGBOUW

TAKELSTELLING

Stellingnummer: _____		STELLINGBOUW FIRMANAAM	
Locatie: _____	Opmerkingen: _____ _____ _____	Geldig tot en met Datum Handtekening	
Opdrachtgever: _____			
Montagedatum: _____			
1e vrijgave door: _____			
Standaard stelling: _____			
Volgens berekeningsnota: _____			
Lichte afwijking: _____			

TIJDELIJKE HIJSSTELLING

MAXIMUM BELASTING
.....Kg

Respecteer de instructienota
VERBODEN STELLING TE WIJZIGEN

LEUNING (NIEUW)

Leuningnummer: _____		FIRMANAAM	
Locatie: _____	Opmerkingen : _____ _____ _____	Geldig tot en met Datum Handtekening	
Opdrachtgever : _____			
Montagedatum : _____			
1 ^{ste} keuring door : _____			

Leuning is gebouwd volgens code van de goede praktijk en XERVON voorschriften
VERBODEN LEUNING TE WIJZIGEN

ST-20

LEUNING (GEEL-ZWART) (NIEUW)



GEACTUALISEERDE INSTRUCTIE STELLINGBOUW



GEACTUALISEERDE INSTRUCTIE STELLINGBOUW

BASISREGELS BINNEN EVONIK:

- WIJZIG NOOIT ZELF EEN STELLING → STAND-BY PLOEG OF AANVRAGEN
- EEN LEUNING IS GEEN ANKERPUNT (BIJ HET OPENEN VAN ROOSTERS BV.)
- ZIE JE IETS DAT NIET KLOPT → MELDEN, KAART OP **ROOD** DRAAIEN
- NOOIT ROMMEL ACHTERLATEN OP EEN STELLINGVLOER
- BIJ TWIJFEL: CONTACTEER JE VERANTWOORDELIJKE OF VAKCOÖRDINATOR
- WE DOEN HET VEILIG OF WE DOEN HET NIET!

Checklist stellinggebruiker voor betreden:

Omschrijving	Ja	Nee
Hangt er een geldig keuringslabel aan de stelling?	☒	☐
Materiaal		
Is het steigermateriaal optisch in orde? (geen platgedrukte of kromme buizen of scheuren)	☒	☐
Zijn de ladders in orde: 75° opstelling, vastgemaakt, onbeschadigd?	☒	☐
Stabiliteit		
Is alles loodrecht en haaks gebouwd?	☒	☐
Steken alle stellingbuizen voldoende ver (+ 5 cm) uit de koppelingen?	☒	☐
Is de stelling stabiel? Zo niet: veranker de stelling.	☒	☐
Zijn er overal onderlegplankjes voorzien? (uitzondering mogelijk op betonen ondergrond)	☒	☐
Bij stellingen op roosters moet er voldoende draagvlak zijn onder de staanders → steunen de onderlegplanken af op onderliggende stalen liggers?	☒	☐
Werkvloeren		
Zijn de afmetingen, de vorm en de ligging van de vloeren aangepast aan de aard van de te verrichten werken en de te dragen lasten?	☒	☐
Zijn de vloeren zodanig gemonteerd dat de onderdelen bij normaal gebruik niet kunnen bewegen?	☒	☐
Is de werkvloer dicht, zijn er geen gevaarlijke openingen in de werkvloer?	☒	☐
Is de werkvloer vrij van restmaterialen? (geen rommel van anderen?)	☒	☐
Zijn de werkvloeren niet te zwaar belast? (200 kg/m ² op één vloer, maximum 100 kg/m ² bij een tweede vloer)	☒	☐
Leuning		
Is er een drielige leuning aanwezig: een vaste kantplank, een knie- en een heupleuning?	☒	☐
Is er een zelfsluitende toegangspoort?	☒	☐
Indien er geen zelfsluitende poort is: kan de stelling toch veilig betreden worden? Hierbij steekt de ladder 1 m boven de bovenste leuning uit.	☒	☐
Bij ladders waarbij de valhoogte meer dan 4 m is: is er een leuning aan de zijkant voorzien?	☒	☐
Indien er werkvloeren zijn op meer dan 6,5 m hoger dan de basis, dan moeten er ladders en tussenbordessen voorzien zijn. Deze bordessen moeten op max. 6,0 m hoogteverschil ten opzichte van elkaar aangebracht zijn. Zijn deze tussenbordessen aanwezig?	☒	☐

Antwoorden via www.mentimeter.com



www.mentimeter.com

Gebruik code : 32 60 17 3

Persoonlijke sloten voor contractoren

Dit slot wordt door elke contractor aan de lockbox aangebracht.

- **De naam van de contractor moet op een duurzame manier op het slot aangebracht worden.**
- Er wordt aanbevolen om, per contractor, dezelfde kleur van sloten te nemen.
- Er mag geen geel, blauw of rood slot gebruikt worden.
- De contractor zorgt zelf voor de nodige sloten voor hun medewerkers.




Het minimum dat door onze bedrijven geëist wordt, is dat elk slot gebruikt door derden in ons LOTO-systeem een label/opschrift krijgt dat altijd toelaat om de betrokken derde te identificeren.

Medewerkers, waarvan de sloten niet aan de minimum eisen voldoen, worden niet toegelaten binnen de desbetreffende opdracht.

Komende Stilstanden op Evonik

Overzicht :

- September 2020 : verbondstilstand AN (vgl met 2019)
- Oktober 2020 : Stilstand Oxeno
- Maart 2021 : verbondstilstand RE (vgl met 2020)

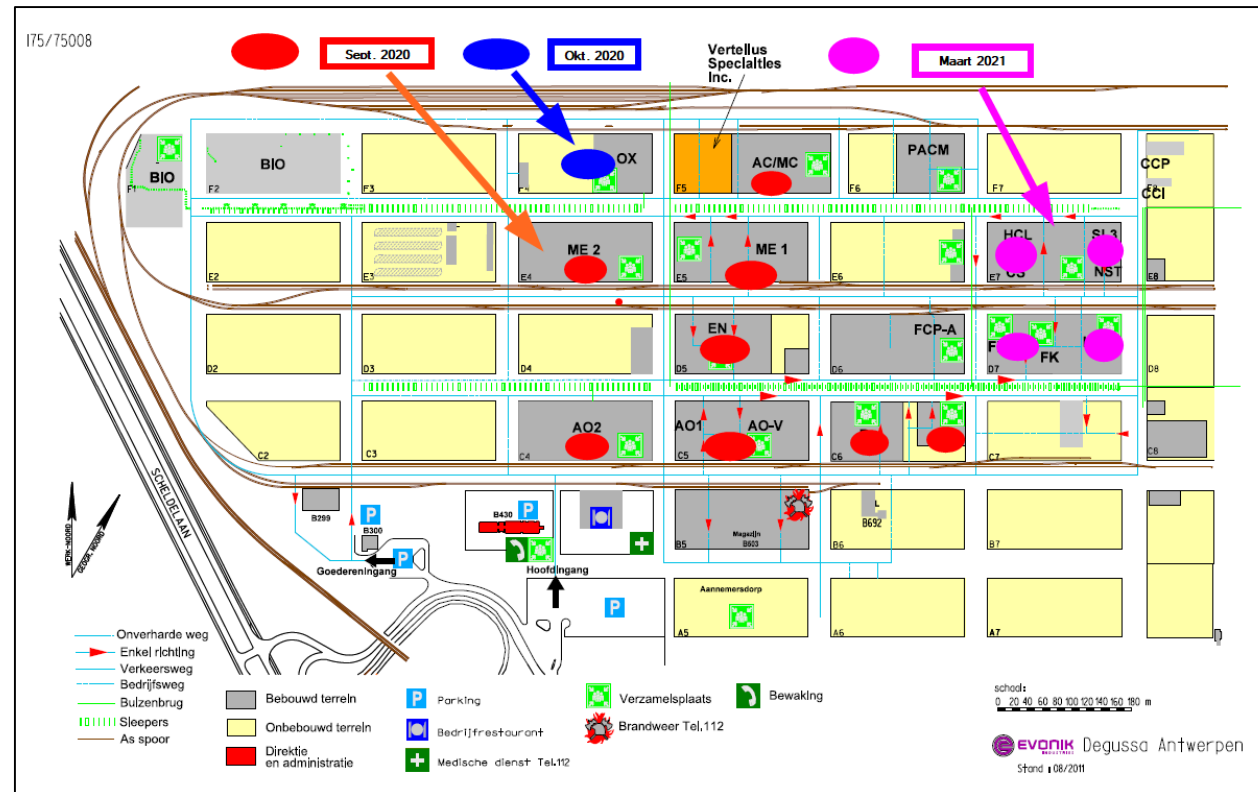

Feedback afgelopen stilstanden :

- Goede en veilige uitvoering door eigen en externe medewerkers
- Orde en netheid is positief verbeterd
- Rondgangen Evonik + Contractorverantwoordelijken is positief onthaald.
- Corona was een uitdaging
- Evonik leerpunten :
 - Scope stilstand moet vroeger afgesloten worden en werkpakketten moeten vroeger overhandigd worden aan contractoren
- Contractoren leerpunten :
 - Meer initiatief rond veilig en efficient uitvoeren
 - ALTIJD LMRA formeel uitvoeren



Onze verwachting

- Geen **ongevallen** met werkverlet.
- **Kwaliteitsvol werk**
- Binnen **termijn**



Resultaten Quiz via Mentimeter



www.mentimeter.com

Gebruik code : 32 60 17 3





EVONIK

Leading Beyond Chemistry
